

KOMUNA E PRIZRENIT
Opština Prizren
Prizren Belediyesi



2024



Raporti vjetor 2024

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE (DSHP)

- RAPORT I SEKTORIT TË INFRASTRUKTURËS
- RAPORT I SEKTORIT TË KOMUNIKACIONIT
- RAPORT I SEKTORIT TË MENAXHIMIT TË MJEDISIT DHE MBETURINAVE
- RAPORT I SHËRBIMEVE TJERA

Janar-Dhjetor 2024

DREJTORI DREJTORISË SË SHËRBIMEVE PUBLIKE

ÇELI LAMAJ



Përmbledhje:

- Drejtoria për Shërbime Publike gjatë vitit 2024 bazuar në planifikimin buxhetor si dhe planit e punës , ka paraparë një mori projektsh të reja (diku rreth **37** projekte), përveç atyre ekzistuese që janë në implementim. rreth **50** projekte që vazhdojnë nga vitet paraprake.
- Projektet që do të realizohen dhe që janë në realizimin I përkasin të gjitha sektorëve që janë të Drejtorisë sonë,pra ka projekte për ndërtim të rrugëve,kanalizimeve,ujësjellësve,urave,mureve mbrojtëse,parqeve,trotuareve,ndriçimit publik,pastrimit të qytetit.Janë edhe një mori kërkesash nga qytetarët e Komunës sonë që pritët të realizohen me pozicionin e projekteve te vogla infrastrukturore.
- Për këtë vit Komuna jonë gjegjësisht Drejtoria për Shërbime Publike ka paraparë buxhet për Investime Kapitale **12,710,000.00€** nga të cilat mjete nga granti qeveritar janë **10,610,000.00€** dhe **2,100,000.00€** nga të hyrat vetanake.
- Në kategorinë M&SH për drejtorinë tonë është paraparë buxhet në vlerë prej **3,089,662.00€**
- Përveç këtij buxheti nga të hyrat e bartuara nga viti 2023, Drejtoria jonë ka përfituar në fondin në vlerë prej **2,422,452.64 €** .Nga ky buxhet pritët të shpenzohet mjete financiare për **5** projekte ,ku shumica e projekteve janë obligime kontraktuale.
- Gjatë kësaj periudhe Drejtoria për Shërbime Publike ka nënshkruar **13** kontrata të reja në vlerën prej **11,494,724.10.Mbi 10** projekte janë në fazën tenderuese, ndërsa janë marr **19** Vendime për fillimin e procedurave për implementimin e projekteve kapitale.Deri në fund të këtij vitit pritët të nënshkruhen edhe disa kontrata të reja.
- Në Periudhën Janar –Dhjetor deri më tani për investime kapitale janë shpenzuar rreth **5,035,353.95€** për kategorinë ekomike të Investimeve dhe **1,138,300.09€** për kategorinë mallra dhe shërbime.

Projekti 1:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi Projekti	O.E. "ISEFERI" SH.P.K & KAB HOLDING SH.P.K- Zgjerimi dhe ndërtimi i rrugës me asfalt në fshatin Novakë- Projekt dy vjeçar
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-22-9790-5-1-1
Vlera e kontratës	402,335.64 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 06-12-2022
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Punimeve	Kontrata eshte realizuar 85% kan mbetur pa u perfunduar vijat e bardha nje pjes shtreses se dyte e asfaltit

Projekti 2:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi Projekti	O.E. "ISEFERI" SH.P.K & KAB HOLDING SH.P.K- Ndërtimi i infrastrukturës në Lagjen Bajram Curri në Prizren (projekt dy vjeçar)
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-22-9693-5-1-1
Vlera e kontratës	440,923.35 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 17-11-2022
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Punimeve	Eshte kryes kontrata ne teresi eshte duke u bere pergaditja per e dokumentacionit per pranim teknik

Projekti 3:

Titulli i projektit: Rivitalizimi i infrastrukturës ne rrugën Marin Barlet-projekt dy vjeçar
Nr. Prokurimit: 622-24-2531-5-2-1
Punëkryerësi: N.N.SH CO-ING
Vlera e kontrates: 133,044.38
Vlera e kontrates pas kolaudit: 101,185.14

Date: 27.11.2024

Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet:

1. Ne kuader te ketij projekti eshte parapare qe te Rivitalizohet kanalizimi fekal,kanalizimi atmosferik,ujsjellsi dhe punimet e elektrikes
2. Plani dinamik i parapare 100 dite
3. Punet te cilat jane kryer: Jane perfunduar sipas projektit dhe paramases te gjitha punimet e KANALIZIMIT FEKAL,ATMOSFERIK dhe te UJSJELLSIT, Ndersa punimet e ELEKTRIKES nuk jane zhvilluar fare kjo me arsyetimin se nje kompani nga ana e KEDS eshte duke kryer te njejtat punime ,dhe me urdher te organit mbikqyres keto pune nuk egzekutohen nga ana e jone.

4. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar:

Vlera e kontrates pas kolaudimit:101,185.14

Jane paguar dy situacione:Fatura nr 09/2024 e dates 24.07.2024 ne vlere 20,000.00 euro, dhe Fatura nr 15/2024 e dates 26.08.2024 ne vlere 31524.63 euro.Eshte bere pranimi i puneve dhe fatura e fundit derzohet te henen me date 02.12.2024 ne vleren 49,660.51



Projekti 4:

Nr. Prokurimit: 622-23-687-5-1-1

Titulli i projektit: “Rehabilitimi dhe ndërtimi I rrugëve dhe trotuareve me kubza”.

PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 971,000.00 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Rehabilitimi dhe ndërtimi I rrugëve dhe trotuareve me kubza ne komunen e Prizerenit .
2. Plani dinamik: 3 vjeqar
3. Punët që janë kryer gjatë këtij muaji: Janë duke u kryer punimet sipas urdheresave te D.SH.P Prizeren
4. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet: Jane kryer pagesa:

Gjithsejt pagesa ne vlere 629,274.87 euro,

Pagesa 10 nr.fatures me vlere 177,200.72 euro është ne process.

Foto nga realizimi i punimeve :



Projekti 5:

Nr. Prokurimit: 622-22-7835-5-2-1

Titulli i projektit: "Ndërtimi i rrugës Qafa e Kushninit -Stanet e Struzhës".

PUNËKRYESI: "Fortesa" SH.P.K - nga Korishë

Çmimi kontraktues : 397,166.00 €

Punët që janë realizuar gjatë këtij viti për projektin :

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Ndërtimi i rrugës me asfalt, punët e ndriqimit dhe të ujësjellësit, dhe punimet e shtegut për këmbësor.
2. Plani dinamik: **400** ditë pune
3. Punët që janë kryer gjatë këtij muaji: Të gjitha punimet kanë përfunduar dhe jemi ne procedura te pranimit teknik.
4. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet:

Gjithësej pagesa në vlerë **337,000.00€** , ndërsa vlera e mbetur për pagesë është **59,925.00 €**.

8. Foto gjate punimeve:



Projekti 6:

Titulli i projektit: “Ndërtimi i ujësjellësit dhe rezervuarit në fshatin Lubizhdë e Prizrenit- Projekt dy vjeçar”.

Nr. Prokurimit: 622-22-12400-5-1-1

KONTRAKTUESIT: “ JOOS & KRASNIQI-BAZË SH.P.K” DHE “SABA BELCA Dega në Kosovë”

PUNËKRYESI: "SABA BELCA" Dega në Kosovë është e autorizuar që ti realizojë punimet.

Çmimi kontraktues : 726,823.00 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Ndërtimi i ujësjellësit dhe ndërtimi i rezervuarit 1 dhe ndërtimi i rezervuarit 2 në fshatin Lubizhdë e Prizrenit.
2. Plani dinamik: 500 ditë pune
3. Punët që janë kryer: Punimet parapërgaditore, hapja e rrugës dhe punët e pastrimit dhe të demolimit të rrugës.
4. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet:

Gjithësej pagesa në vlerë **500,000.00€**, ndërsa vlera e mbetur për pagesë është **226,823.00 €**.

Foto gjate punimeve:



Projekti 7:

Titulli i projektit: “Ndërtimi I kanalizimit te hapur, mureve mbrojtese dhe rregullimi I rrugicave ne fshatin Krushë e Vogël – Projekt dy vjeqar
PUNËKRYESI: OE- FLORI SHPK – nga Studenqani – Suharekë ,Nr. Prokurimit: 622-24-154-5-1-1

Çmimi kontraktues: 484,567.16 € / **Aneks Kontrata:** 47,492.00 €

Totali I vlerës: 532,059.16 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Ne kete kontratë jan te parapara te behet shtrimi i disa rrugeve me kubza, nje rrugë me asfalt, kanalizim fekal 1,300m dhe atmosferik 320m, mure mbrojtese 340m dhe rregullimi i kanalit me beton, si dhe pastrimi i kanaleve kezistuese.
2. Punët që janë përfunduar: Punimi i kanalizimit fekal ka perfunduar ne tersi Eshte duke u punuar me Mure mbrojtëse Buxheti: Deri ne keto momente punë të realizuara rreth **180,000.00 €**
3. Deri tani janë paguar dy situacione me vlerë totale: **140,000.00 €**
Punë të përfunduara dhe të pa paguara deri ne keto momente, rreth **40,000.00 €** Punimet janë duke vazhduar me ndertimin e mureve mbrojtëse.



Projekti 8:

Nr. Prokurimit: 622-23-11960-5-1-1

Titulli i projektit: “Rehabilitimi dhe mirembajtja e ssitemit te kanalizimit dhe ujesjellesit ne qytetin e Prizrenit dhe ne fshatrat e Prizrenit”

Punëkryerësi: GEO- Qemal Krasniqi B.I.; Fortesa SH.P.K; HIDRO PROJEKT SH.P.K; ALFA.i; Benita Company

Vlera e kontraktuar: 2,500,000.00 €


Hyrja e kontrates ne fuqi: 17.04.2024, perfundon me: 16.04.2027 (sipas planit dinamik 36 muaj)

Titulli: Raporti i punimeve

1. **Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet:** Qëllimi i këtij projekti është që të bëhet mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellësit nëpër qytet dhe nëpër fshatrat e Prizrenit.

2. **Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar:** Totali i pagesave të kryera që nga fillimi i ekzekutimit të punimeve janë gjithësej pagesa me vlerë: 791.446,91€, ndërsa vlera e mbetur për pagesë është 1.708.553,09 €.
3. **REZULTATET E PËRGJITHSHME (numra, statistika të përgjithshme nga e gjithë puna):** Që nga fillimi i kontratës janë ndërtuar kanalizime me gjatësi L= 5285m', ndërtuar ujësjellës me gjatësi L= 1061 m'. Kanë përfunduar gjithësej 46.32% i punimeve.

Fotot:

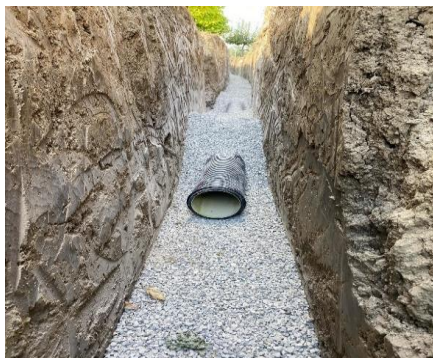

Projekti 9:


Nr. Prokurimit: 622-22-7102-5-1-1 **Titulli i projektit:** "Pastrimi i pusetave dhe ujëmbledhesave ne rrjetin e kanalizimit ne Komunen e Prizrenit

Punëkryerësi: "NTPN "KRASNIQI- Qemal Krasniqi BI dhe ALFA.i shpk"

Vlera e kontraktuar: 613.960,00 € (+ 30% i kontrates 184.188,00 €) Gjithësej: 798.148,00 €

Fillimi i punimeve: 11.10.2022 (plani dinamik: 36 muaj)

1. **Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet:** Qëllimi i këtij projekti është që të bëhet pastrimi i pusetave, ujëmbledhesave, rrjeti i kanalizimit, rrugëve në Komunen e Prizrenit
2. **Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar:** Totali i pagesave të kryera që nga fillimi i ekzekutimit të punimeve janë gjithësej 23 pagesa me vlerë: 592,007.35€, ndërsa vlera e mbetur për pagesë është 206.140,65€.
3. **REZULTATET E PËRGJITHSHME (numra, statistika të përgjithshme nga e gjithë puna):** Që nga fillimi i kontratës janë pastruar kanalizime me gjatësi L= 44854,50m', numri i pusetave të pastruara janë gjithësej 4963 copë, kurse numri i ujëmbledhësave janë 4429 copë. Kanë përfunduar gjithësej 74.17% i punimeve.

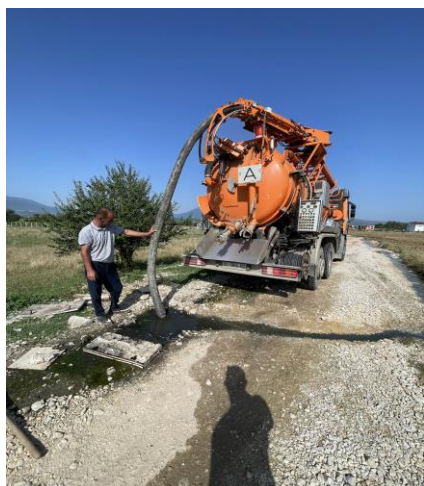

Projekti 10:

Nr. Prokurimit: 622-21-2999-5-1-1

Titulli i projektit: “Regullimi i infrastrukturës në rrugën Xhemë Gigollaj”.

PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 88.618,00€

4. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në kuader të këtij projekti parashihet të kryhet kanalizim atmosferik dhe rruga me trotuar në njëren anë, rigolla monolite si dhe dy shtresat e asfaltit etj.

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar – situacionet Gjithsejt pagesa në vlerë 79.756,11€ ,ndersa vlera e mbetur për pagesë është 8,861.90 euro.

5. Foto nga realizimi i punimeve në këtë muaj



Projekti 11:

Nr. Prokurimit: 622-22-11274-5-1-1/C1031

Titulli i projektit: “NDËRTIMI I RRUGËS TRANZITORE-KRYQIZIMI ME AUTOSTRADËN NË PRIZREN (PROJEKT DY VJEQAR)”.

PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 785.054,50€

- 1 Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në kuader të këtij projekti parashihet të kryhet kanalizim atmosferik, kanalizimi fekal, ndriqimi publik dhe rruga me sinjalizim horizontal dhe vertikal etj.

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar – situacionet

- 2 Foto nga realizimi i punimeve në këtë muaj



Projekti 12:

Nr. Prokurimit: 622-22-8346-5-2-1/C935

Titulli i projektit: “ASFALTIMI I RRUGËS TREPETICË-PETROVË”. PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 198.933,98€

- 1 Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në kuader të këtij projekti parashihet të kryhet rruga me dy korsi, si dhe shenjeimi horizontal dhe vertikal etj.
- 2 Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar Gjithsejt pagesa në vlerë **190,343.65€**, ndersa vlera e mbetur për pagesë pas barazimit përfundimtar është **1,343.71 euro**.
- 3 Foto nga realizimi i punimeve në këtë muaj



Projekti 13:

Nr. Prokurimit: 622-22-7936-5-2-1/C925

Titulli i projektit: “Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në zonën nga rrethi i Ben-af deri në Ortakoll, hekurudha (faza e dytë)”.

PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 388.943,83€

- 1 Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në kuader të këtij projekti parashihet të kryhet kanalizimi atmosferik, rruga me dy korsi gjithsejt tre Akse, shiriti rreshtues te hyrja e ABI Qarshis dhe rrethrotullimi te energjencia, ndriqimi publik , si dhe shenjezi horizontal dhe vertikal etj.
- 2 Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet: Gjithsejt pagesa ne vlere **170.821,49€** ,ndersa vlere e mbetur per pages pas barazimit përfundimtar eshte **50.000,00 euro**.
- 3 Foto nga realizimi i punimeve ne kete muaj:



Projekti 14:

Nr. Prokurimit: 622-23-6433-5-2-1/C1198

Titulli i projektit: “Ndërtimi i rrugës Billushë deri te aksi rrugor Zhur Dragash - projekt dy vjeçar”.

PUNËKRYESI: OE “SEFERI-CO” SH.P.K nga SUHAREKA

Çmimi kontraktues: 283.819,58€

- 1 Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në kuader të këtij projekti parashihet të kryhet rruga me dy korsi, si dhe shenjezi horizontal dhe vertikal etj.
- 2 Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar: Gjithsejt pagesa ne vlere **165.464,60€** , ndersa vlere e mbetur per vazhdimin e punimeve është: **118.354,98 euro**.
- 3 Foto nga realizimi i punimeve ne kete muaj



Projekti 15:

“Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe vendosja e ujëmatësave jashtëm pronës private në fshatin Zhur Prizren” me numër prokurimi 622-23-5344-5-1-1 Vlera e kontratës = €2,497,919.29

PUNËKRYESI: OE “Xërxa” SH.P.K nga Rahoveci

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar

Punët e kryera deri më tani = 72.06% = vlera e punëve të kryera = €1,800,000.00.

Vlera e faturave të të paguara = €575,000.00



Projekti 16:

“Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën Nënë Tereza në Prizren – projekt dy vjeçar” me numër prokurimi 622-23-11599-5-1-1 Vlera e kontratës = €779,820.86

PUNËKRYESI: OE “Xërxa” SH.P.K nga Rahoveci

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar

Punët e kryera deri më tani = 91.04% = vlera e punëve të kryera = €710,000.00.

Vlera e faturave të paguara = €260,023.47



Projekti 17:

“Rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën Edit Durham në Prizren – projekt dy vjeçar” me numër prokurimi 622-23-11599-5-1-1 Vlera e kontratës = €639,314.96

PUNËKRYESI: OE “Xërxa” SH.P.K nga Rahoveci

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar

Punët e kryera janë kryer komplet ne përqindje prej = 99.88% = vlera e punëve të kryera = €638,520.39

Vlera e faturave të paguara = €557,161.83

Vlera e faturave të papaguara = €637,161.83 - €557,161.83 = €80,000.00.

Projekti 18:

Titulli i projektit : “Ndërtimi i infrastrukturë në Korishë – Projekt dy vjeçar”

Nr. prokurimi: 622-23-13004-5-1-1

Çmimi kontraktues : 1,424,995.34 €

Kompania Punekryese : Fortesa Shpk.

• Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet:

Punimi i rrugëve, mureve mbrojtëse, trotuarëve, kanalizimeve atmosferike dhe kanalizimeve fekale. Gjithsejt 35 Akse.

• Punët që kanë përfunduar :

Kanalizimi Fekal si dhe pergaditja e bazës për kubza – Aksi 2;

Pergaditja e bazës për kubza Aksi 3,

Pergaditja e bazës për kubza - Aksi 5;

Pergaditja e baze per kubza – Aksi 11;
 Kanalizimi Fekal dhe pergaditja e baze per kubza – Aksi 13;
 Pergaditja e baze per kubza – Aksi 15;
 Kane perfunduar te gjitha punimet – Aksi 20;
 Pergaditja e baze per kubza – Aksi 28;
 Pergaditja e baze per kubza – Aksi 30;
 Kan perfunduar te gjitha punimet – Aksi 34;
 Kanalizimi Fekal – Aksi 35.



Projekti 19:

“ Rehabilitimi dhe rivitalizimi i hapsirave publike ne zonen e pare te mbrojtur ne pjesn e vjeter te qytetit ,reastaurimi i shesheve dhe objekteve , projekt tre vjeqar “

Numri I prokurimit : 622-23-11319-511

Kontraktuesi : GOE G-PROJEKT ; Rinesa SHPK , LIMITPROJECT SHPK , DELTA – CCD

Qmimi per njesi eshte : 5,743.70 €

Vlera e parashikuar e kontrates per 36 muaj eshte: 3,000.000.00 €

Eshte realizuar kanalizimi fekal me gjatesi mbi 280 m ne thellesi deri 4 m

Jane realizuar edhe punimet e kanalizimit atmosferiksipas specifikave ne projekt

Ne bashkpunim me KRU Hidroregjioni jugor po behet zevendesimi I gypit te azbestit me gyp te ri nga Polietileni

Punimet ne sheshin shadervan ne qendren historike sidomos punimet e infrastruktures nentoksore sidomos rregullimi i rrjeteve te furnizimit me uje te pijes dhe kanalizimin fekal dhe atmosferik per bizneset dhe banoret e zones

Po ashtu eshte duke u punuar edhe shtegu per kala

Po jua bashkangjesim edhe disa foto



Projektet e ndricimit publik

Projekti 20:

Emri i Projektit	Instalimi dhe riparimi i ndriçimit publik në lagjet Ortakoll, Bajram Curri, Tusus, Arbanë, Jeta e re, dhe në fshatrat Piranë, Zhur, Hoqë e qytetit e tjera lokalitete”
	Kontratë kornizë trevjeçare
Investitori	Drejtoria e Shërbimeve Publike - KOMUNA E PRIZRENIT
Kompania	“LCE” Sh.P.K dhe “Sinco Grup” L.L.C - Prishtinë
Nr Prokurimit	622-24-452-2-1-1
Çmimi	Çmimi per njësi është 97,046.90 € - Vlera e parashikuar e kontratës 2,500,000.00 €

Përmbajtja e kësaj kontrate është zhvillimi i punimeve ne mirëmbajtjen dhe instalimin e ndriçimit publik ku përfshihet vendosja e dritave LED SMART me fuqi te ndryshme prej 25W-80W. Dritat do të kontrollohen përmes nje Softueri te licencuar për ndriçimin LED me ç’rast do të bëhet menaxhimi nga distanca e ndriçimit. Për te gjitha pozitat e shtyllave të ndriçimit në tërë territorin e Komunës do te bëhen matjet gjeodezike të rrugëve (piketimi i shtyllave ekzistuese) dhe këto të dhëna do të futen në databazë.

Para se te vendosen dritat SMART do te behet auditimi i ndriçimit për rrugët ku do te vendosen dritat Smart ku përfshihet: simulimi i rrugës përmes softuerit Dialux apo te ngjashëm, matja me luxmeter në terren para dhe pas zbatimit te masave të EE, hartimi i raportit te auditimit te energjisë elektrike dhe zbatimi i këtyre masave në rrugët e caktuara.

Për momentin është duke u bere vendosja e dritave SMART ne Unazën e Qytetit dhe pastaj do te vazhdohet me rrugët kryesore të hyrje-daljeve të qytetit.

Foto gjate vendosjes se dritave SMART:



Projekti 21:

Emri i Projektit	RREGULLIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË FSHATIN LUBIZHDË E HASIT. PROJEKT DYVJEÇAR
Investitori	Drejtoria e Shërbimeve Publike - KOMUNA E PRIZRENIT
Kompania	Multi Business Group Sh.P.K. dhe "Risamont" Sh.P.K – Prizren
Nr Prokurimit	622-22-13125-5-2-1
Çmimi	444,887.00 €

Është bërë kompletimi i instalimit të ndriçimit publik nëntokësor për për 6 rrugë ku janë përfshirë këto aktivitete: gërmimi i kanalit për ndriçim publik., vendosja e shiritit për vërejtje, vendosja e shiritit të tokëzimit, gypit fleksibil, punimi i bazamanteve për vendosjen e shtyllave të ndriçimit publik, montimi i shtyllave metalike, montimi i lirave , montimi i ndriçuesve LED, punimi i trotuareve në segmentet përkatëse. Punimet e këtij projekti kane përfunduar ne muajin Maj 2024. Gjatësia e rrugëve që janë ndriçuar është 6.750 m. Janë vendosur 238 drita te reja LED te vendosura janë me fuqi 40W Rrugët neper te cilat janë vendosur dritat janë:

- 1 SHEH SALIHI
- 2 QERIM GIGOLLAJ
- 3 NUHË ELEZI
- 4 DERVISH MAHMUTI
- 5 MUSTAFË GIGOLLAJ
- 6 SELMAN OSMANKAJ

Fotot gjatë punimeve në fshatin Lubizhdë te Hasit:



Projekti 22:

Emri i Projektit	NDËRTIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË KORISHË
Investitori	Drejtoria e Shërbimeve Publike - KOMUNA E PRIZRENIT
Kompania	Multi Business Group Sh.P.K. dhe "Risamont" Sh.P.K - Prizren
Nr Prokurimit	622-23-7717-5-2-1
Çmimi	295,769.00 €

Komuna e Prizrenit, me këtë projekt ka investuar në modernizimin e ndriçimit publik në fshatin Korishë. Ndriçimi publik ekzistues ka qenë i vjetruar, jokualitativ dhe jo ekonomik. Armaturat ndriçuese me poq të natriumit dhe me poq të zhivës janë zëvendësuar me armatura ndriçuese të teknologjisë LED. Ndriçuesit LED te vendosura janë me fuqi 40W. Gjatësia e rrugëve që janë ndriçuar është 23.770 m. Janë vendosur 738 drita te reja dhe 127 shtylla të reja të betonit

Punimet e këtij projekti kane përfunduar ne muajin Qershor 2024. Është bërë kompletimi i instalimit të ndriçimit publik ajror për 23 rrugë ku janë përfshire këto aktivitete: demontimi i ndriçuesve, lirës dhe kabllit ekzistues, montimi i kabllit të ri përkatës ajror, montimi i shtrëngueseve, unazave, klemave, lirave, ndriçuesve LED dhe montimi i shtyllave të betonit. Rrugët neper te cilat janë vendosur dritat janë:

- 1 BRAHIM UKIMERI**
- 2 SELMAN BOBAJ**
- 3 AVDYL COLI**
- 4 SADRI KABASHI**
- 5 REXHEP HAXHI KABASHI**
- 6 NUHË KABASHI**
- 7 NUHË UKAJ**
- 8 NAZIF AHMETAJ**
- 9 XHEMË MUÇAJ, AVDYL MUÇAJ, ILIAD**

- 10 JONUZ REXHAJ DHE HAXHI ISENI
- 11 13 MAJI
- 12 FATMIR REXHAJ
- 13 PRANVERA 81
- 14 AJET MUÇAJ
- 15 AZEM AHMETI DHE AHMET AHMETAJ
- 16 BOGDANI
- 17 SELIM KABASHI
- 18 BURIMI I UJIT
- 19 GURINA
- 20 UJËVARA
- 21 DUHI
- 22 OSMAN KABASHI DHE UKË ALITI
- 23 BRAHIM LUMA

Fotot gjatë punimeve në fshatin Korishë:



Projekti 23:

Emri i Projektit	Rregullimi i ndriçimit publik në fshatin Lukije-projekt dy vjeçar
Investitori	Drejtoria e Shërbimeve Publike - KOMUNA E PRIZRENIT
Kompania	Multi Business Group Sh.P.K. dhe "Risamont" Sh.P.K – Prizren
Nr Prokurimit	622-24-1959-5-2-1
Çmimi	95,608.00 €

Është bërë kompletimi i instalimit të ndriçimit publik nëntokësor ku janë përfshirë këto

aktivitete: gërmimi i kanalit për ndriçim publik., vendosja e shiritit për vërejtje, vendosja e shiritit të tokëzimit, gypit fleksibil, punimi i bazamanteve për vendosjen e shtyllave të ndriçimit publik, montimi i shtyllave metalike, montimi i lirave, montimi i ndriçuesve LED, punimi i trotuareve në segmentet përkatëse. Punimet e këtij projekti janë duke përfunduar dhe ka mbetur vetëm vendosja e dy ormanëve elektrik. Gjatësia e rrugëve që janë ndriçuar është 2.450 m. Janë vendosur 72 drita të reja LED të vendosura janë me fuqi 40W



Projekti 24:

Nr. Prokurimit: 622-23-6590-5-2-1

Titulli i projektit: "Ndertimi i infrastruktures ne fshatin Atmaxhe

Punëkryerësi: "NTPN "KRASNIQI- Qemal Krasniqi BI

Vlera e kontraktuar: 50.294,96 €

Titulli: Raporti i punimeve

1. **Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar:** Totali i pagesave të kryera që nga fillimi i ekzekutimit të punimeve janë gjithsej 2 pagesa me vlerë: 35.814,84€, punimet të punuara dhe të papaguara 11.441,57€ ndërsa vlera e mbetur për pagesë është 14.480,12€.
2. **REZULTATET E PËRGJITHSHME (numra, statistika të përgjithshme nga e gjithë puna):** Që nga fillimi i kontratës janë pastruar kanalizime me gjatësi $L = 774\text{m}'$, rregullimi i aksit me kubeza është $561,54\text{ m}^2$. Kanë përfunduar gjithsej 93.95% të punimeve.



Projekti 25:

Nr. Prokurimit: 622-23-6762-5-1-1

Titulli i projektit: "Ndërtimi i kanalizimit dhe rrugëve në Skorobisht-projekt dy vjeçar"

PUNËKRYESI: "Fortesa" SH.P.K - nga Korishë

Çmimi kontraktues : 324,202.08 €

Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet:

Janë kryer dy situacione dhe pagesa:

Gjithësej pagesa në vlerë **199,741.52€** , ndërsa vlera e mbetur për pagesë është **124,460.56 €**.

Foto gjate punimeve:



Projekti 26:

Punëkryesi: O.E: **N.N.T. "Etniku"**

Projekti: Ndërtimi i infrastrukturës (rrugë,kanalizim,ujësjellës) në Tusus -projekt dy vjeçar

Nr. Prokurimit: 622-23-9558-5-1-1

Çmimi kontraktues: **999,598.70 €**

Punë të realizuara; **717,307.14 €**

Ne kuader te këtij projekti jane kryer dhe duke vazhduar rrugw, kanalizim, ndricim publik, duke neper lagje.

Të bashkangjitur gjeni disa foto nga punimet e realizuara.



Projekti 27:

Autoriteti	Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures
Kontraktues:	O.E. “RENELUAL TAHIRI SH.P.K. & QUALITY ASPHALT” SH.P. K
Punekryesi:	“Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrugëve me asfalt “
Projekti:	Nr. Prokurimit: 622-23-687-5-1-1
Nr. Kontratës	3,470.000.00 €
Vlera e kontratës	Totali: 1 627 281.78 €
Pagesat e kryera	

Fillimi i punimeve	Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 22.05.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik (kontrate kornize 36 muaj)
Realizimi i Punimeve	Disa prej punimeve te kryera ne vitin 2024: - Rruga kryesore ne fshatin Dobrusht; - Rruga “Turgut Ozal”; - Rruga “Saraqet”; - Rruga “Destan Billusha”; - Rruga “Sahat Kulla”; - Rruga “Fehmi Lladrovci” dhe “Xhemil Fluku”; - Rruga “Vlashnje – Kobaj”; - Sheshi ne fshatin Zojz; - Rruga në fshatin Vlashnje; - Rruga Kobaj - Grazhdanik; - Rruga kryesore në fshatin Hoqë e Qytetit; - Rruga në Karashëngjergj; - Rruga në fshatin Zym; - Rruga në fshatin Caparc; - Rruga në fshatin Pousko; - Rruga në fshatin Jeshkovë; - Rruga në fshatin Nashec; - Gropat në fshatin Lubizhdë; - Gropat në fshatin Romajë; - Rruga Shuaip Spahiu; - Rehabilitimi dhe shtresimi i disa rrugëve në Qytet në të cilat është bërë rregullimi i kanalizimit nga HRJ;

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 28:

Autoriteti Kontr.:

Komuna e Prizrenit

Punekryesi

GOE - Trasing Group Sh.p.k. dhe G-Project Sh.p.k.

Projekti

Rregullimi i trotuareve ne unazën e Qytetit te Prizrenit

Nr. Kontratës

622-22-8511-5-1-1

Vlera e kontratës

1,577,245.22 €

Pagesat e kryera

Totali: 1,294,956.57 € (të paguara deri më tani)

Fillimi i

Punimet kan filluar me datën 08.11.2022

punimeve



Plani Dinamik

Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj.

Realizimi

Punimet kane perfunduar ne teresi

Foto nga tereni

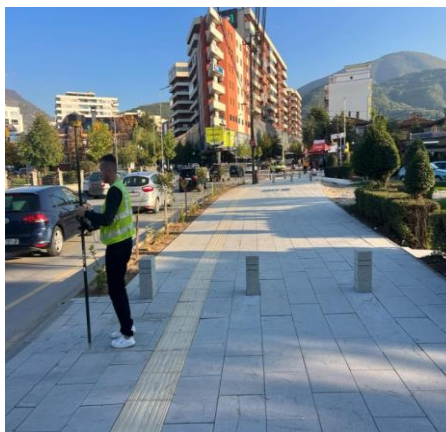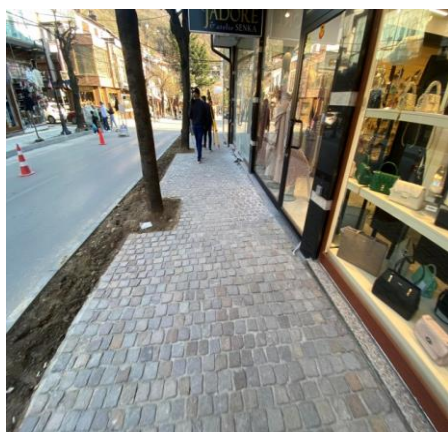

Projekti 29:

Autoriteti

Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures

Kontraktues:

Punekryesi:

O.E. "BENITA COMPANY" SH.P.K- Klinë

Projekti:

Rregullimi I infrastruktures ne lagjen Dardania 2 (projekt 2

vjecar)- Lot 2-Degezimi te udhëkryqi gjatesia Aksi1 L=568.52m,
B=14.00m; Aksi2 L=356.40, B=9m

Nr. Kontratës
Vlera e kontratës
Pagesat e kryera

Nr. Prokurimit: 622-22-7588-5-1-1/C965
473.233,09 €
Totali: 465,867.62 € (të paguara deri më tani)

Fillimi i punimeve Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 25.11.2022
Plani Dinamik Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj
Realizimi i Punimet ne LOT 2 kane perfunduar, ndërsa jane duke vazhduar punimet ne
Punimeve LOT 3 ku kemi probleme me prona dhe çvendosje te shtyllave te elektrikes.

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 30:

Autoriteti Kontr.: Komuna e Prizrenit
Punekryesi GOE - "Pro & Co Group" SHPK ARCHI TIME SHPK
Projekti Rregullimi i infrastrukturës në lagjen Dardania 2 – LOT 1

Nr. Kontratës 622-22-7588-5-1-1
Vlera e kontratës 855,555.55 €
Pagesat e kryera Totali: 647,545.29 € (të paguara deri më tani)

Fillimi i Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 24.11.2024
punimeve
Plani Dinamik Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Kane përfunduar mbi 95% të punimeve sipas kontratës.Është kryer
Punimeve edhe asfaltimi i shtresës së parë.Ka mbetur per tu zhvendosur shtylla
e tensionit e cila gjendet ne rrugë si dhe punët tjera finale.

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 31:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	O.E. "H.SEFERI" SH.P.K- Suharekë
Projekti	Ndërtimi i infrastrukturës në lagjen Jeta e Re - rruga Agim Bajrami tek Hekurudhat
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-22-7866-5-1-1
Vlera e kontratës	387.533,50 €
Pagesat e kryera	Sit. IX 33,519.82 € (pagesa perfundimtare)
	Totali: 305,767.33 € pagesa te kryera

Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 17.10.2022
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik.
Realizimi i Punimeve	Projekti ka perfunduar dhe eshte bere pranimi teknik dt.27.07.2024 Verejtje: pozicionet e gjelbrimit mbeten pa u ekzekutuar shkak i mungeses se hapesires per ekzekutim.

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 32:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	GOE - "Pro & Co Group" SHPK ARCHI TIME SHPK
Projekti	Ndertimi i infrastrukturës te shkolla e Dradanise

Nr. Kontratës	622-23-14216-5-2-1
Vlera e kontratës	275,555.55 €
Pagesat e kryera	Totali: 120,752.55 € pagesa te kryera

Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar me datën 25.03.2024
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Punimeve	Jane kryer 85% te punimeve , komplet infrastruktura dhe asfaltti shtresa e pare.

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 33:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	OE -" FORTESA" SH.P.K.
Projekti	Ndertimi i rrugës Velezh - Smaç

Nr. Kontratës	622-23-6163-5-2-1
Vlera e kontratës	157,349.39 €
Pagesat e kryera	Totali: 128,000.00 € (të paguara deri më tani)

Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar me datën 13.09.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik 12 muaj.
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar sipas kontrates.


Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 34:

Autoriteti Kontr.: Punekryesi Projekti	Komuna e Prizrenit OE -“ FLORI” SH.P.K. Ndertimi i infrastrukturës ne lagjen Arbana
Nr. Kontratës	622-23-5609-5-2-1
Vlera e kontratës	226,871.84 €
Pagesat e kryera	Totali: 196,047.34 € (të paguara deri më tani)
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar me datën 24.07.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar komplet sipas kontrates

Foto e ekzekutimit të punimeve:

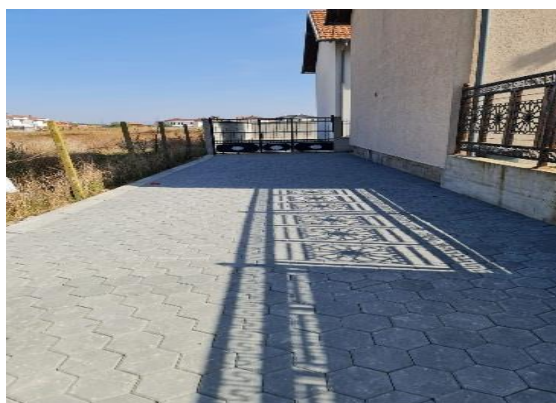


Projekti 35:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
---------------------------	---------------------------

Punekryesi Projekti	OE -“ KAB Holding” SH.P.K. Ndertimi i rrugës me asfalt dhe murit mbrojtës në Manastiricë
Nr. Kontratës	622-24-8286-5-2-1
Vlera e kontratës	319,810.07 €
Pagesat e kryera	Nuk ka pagesa te kryera
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar me datën 21.10.2024
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik 24 muaj.
Realizimi i Punimeve	Kontrata eshte realizuar 10% kan mbetur pa u perfunduar muret mbrojtese dhe mbistruktura e rruges

Foto e ekzekutimit të punimeve:

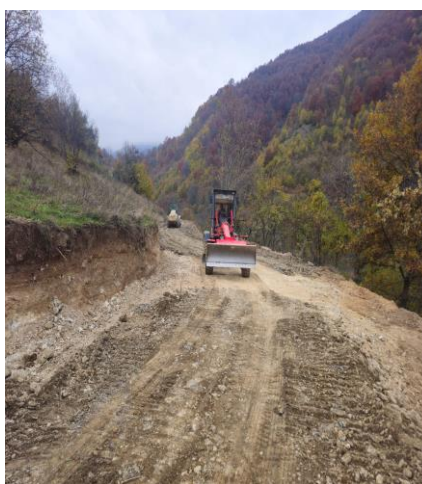

Projekti 36:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi Projekti	OE -“ FORTESA” SH.P.K. Rregulimi i infrastrukturës në rrugën Ersan Mazreku - projekt dy vjeqar
Nr. Kontratës	622-21-3413-5-2-1
Vlera e kontratës	178,189.80 €
Pagesat e kryera	Jane kryer pagesa ne vlere173,320.71 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 37:

Autoriteti Kontr.: Komuna e Prizrenit
Punekryesi OE -“ FORTESA” SH.P.K.
Projekti Ndriqimi,shtruarja e rrugëve me kubëza dhe rregullimi i parqeve në fshatrat e Zhupës dhe Lumëbardhit
Nr. Kontratës 622-21-8748-5-2-1

Vlera e kontratës 99,355.18 €

Pagesat e kryera Jane kryer pagesa ne vlere 92,512.36 €

Fillimi i punimeve Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve Punimet kane perfunduar

Projekti 38:

Autoriteti Kontr.: Komuna e Prizrenit
Punekryesi OE -“ FORTESA” SH.P.K.
Projekti Ndriqimi,shtruarja e rrugëve me kubëza dhe rregullimi i parqeve në fshatrat e Zhupës dhe Lumëbardhit
Nr. Kontratës 622-21-8748-5-2-1

Vlera e kontratës 99,355.18 €

Pagesat e kryera Jane kryer pagesa ne vlere 92,512.36 €

Fillimi i punimeve Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve Punimet kane perfunduar

Projekti 39:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	OE - "ART PROJECT" SH.P.K.
Projekti	Ndërtimi i rrugës Duhë në Korishë-Projekt dy vjeçar
Nr. Kontratës	622-22-11041-5-2-1
Vlera e kontratës	86.997,89 €
Pagesat e kryera	Jane kryer pagesa ne vlere 77,581.09 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 40:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	OE - "ART PROJECT" SH.P.K.
Projekti	Ndërtimi i urës në fshatin Shpenadi dhe në Lubizhdë të Prizrenit - Projekt dy vjeçar
Nr. Kontratës	622-22-10894-5-2-1
Vlera e kontratës	20.312,14 €
Pagesat e kryera	Jane kryer pagesa ne vlere 18,241.43 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 41:

Autoriteti Kontr.:
Punekryesi
Projekti

Komuna e Prizrenit
OE -“ Gashi ING” SH.P.K.
Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Korishë

Nr. Kontratës

622-20-4661-5-2-1

Vlera e kontratës

294305.37 €

Pagesat e kryera

Jane kryer pagesa ne vlere 229,551.39 €

Fillimi i
punimeve
Plani Dinamik
Realizimi i
Punimeve

Punimet kan filluar sipas kontrates
Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 42:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	OE -" Gashi ING" SH.P.K.
Projekti	Ndërtimi i rrugëve lokale në Lubizhdë të Hasit – Projekt dy vjeçar
Nr. Kontratës	622-20-4661-5-2-1
Vlera e kontratës	327118,51 €
Pagesat e kryera	Jane kryer pagesa ne vlere 308,344.30 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 43:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi	OE -" Gashi ING" SH.P.K.
Projekti	Rregullimi i infrastrukturës në rrugën Kosova
Nr. Kontratës	622-21-2999-5-1-1
Vlera e kontratës	285511.09 €
Pagesat e kryera	Jane kryer pagesa ne vlere 274,893.45 €
Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontrates
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipas planit dinamik
Realizimi i Punimeve	Punimet kane perfunduar

Foto e ekzekutimit të punimeve:



Projekti 44:

Kompania Punekryese: Flori Shpk

Titulli i projektit: “Ndërtimi i infrastrukturës në Nashec (rrugë, kanalizim dhe ujësjellës) – projekt dy vjeçar”

Nr. prokurimi: 622-23-9713-5-1-1

Çmimi kontraktues : 418,068.35 €

6. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në këtë kontratë është e paraparë të bëhet Kubzimi i 24 akseve rrugore, 4 Mure mbrojtëse, një Urë dhe 1 trotuar
7. Gjendja aktuale: Deri ne keto momente punë të realizuara rreth: **250,000.00 €** ose 60% e kontratës e realizuar

Te paguara deri tani pesë situacione me vler totale: **170,000.00 €**

Punë të realizuara dhe të pa paguara deri tani rreth: **80,000.00 €**

FOTO NGA TERENI:



Projekti 45:

Kompania Punekryese: Flori Shpk

Titulli i projektit: “Ndërtimi I infrastrukturës në fshatin Landovic ”



Nr. prokurimi: 622-21-6931-5-2-1

Çmimi kontraktues : 182,536.42 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në këtë kontratë është e paraparë të bëhet Kubzimi i nje aksi rrugor me gjatesi totale 1,230m dhe siperfaqe te kubzave 6,250 m², Rregullimi i shtratit të lumit me beton me gjatesi 186m etj.
2. Gjendja aktuale: Janë realizuar 4 pagesa me vlerë totale: **140,000.00 €** ose 77% e kontratës është realizuar.

3. Çështjet problematike: Mungesa e mjeteve për mbyllje të kontratës nevojiten dhe:
42,000.00 €,
4. Foto nga realizimi i punimeve në këtë vitë

FOTO NGA TERENI:

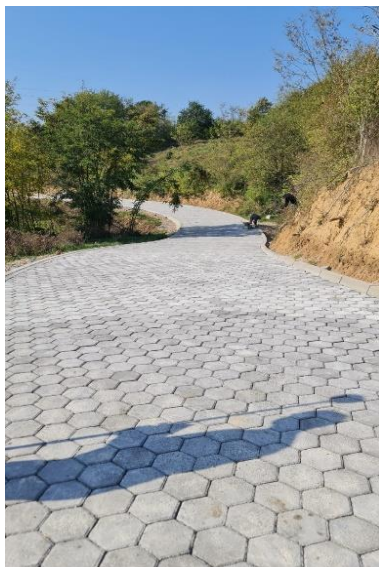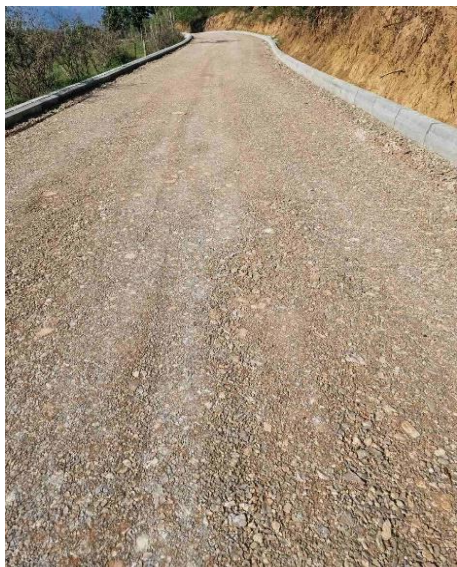

Projekti 46:

Kompania Punekryese: Flori Shpk

Nr. Prokurimit: 622-22-11781-5-2-1

Titulli i projektit: “Ndërtimi I infrastrukturës në fshatin Malsi e Re – Projekt dy vjeçar”.

Çmimi kontraktues: 194,893.69 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në këtë kontratë është e paraparë të bëhet Asfaltimi, Kubzimi rrugë dhe trotuare, kanalizime fekale dhe atmosferike etj.
2. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar - situacionet: Janë realizuar gjithsej 4 pagesa me vlerë: **140,000.00 euro**, ndersa vlera e mbetur per pages eshte **54,000.00 euro**.
3. Foto nga realizimi i punimeve ne kete vit



Projekti 47:

Kompania Punekryese: FLAMURI V ;Benita Company,BESIONI SH.P.K.

Nr. Prokurimit: 622-23-6426-5-2-1

Titulli i projektit: “Ndertimi i infrastrukturës në fshatin Zhur”.

Çmimi kontraktues: 183,919.86 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Në këtë kontratë është e paraparë të bëhet Punimi i 17 Akseve , prej tyre Kubzimi i 15 akseve rrugore, 2 Akse Kanalizim fekale
2. Punët që janë përfunduar: Deri tani janë punuar 2 akset me kanalizim fekal dhe 5 akse kubëzim i rrugëve.
3. Gjendja aktuale: Deri ne keto momente punë të realizuara rreth: **123,000.00 € ose 67% e** kontratës e realizuar

Te paguara deri tani tre situacione me vler totale: **120,882.00 €**

Punë të realizuara dhe të pa paguara deri tani rreth: **2,118.00 €**

4. Çështjet Problematike: **Mungesa e mjeteve**

FOTO NGA TERENI:



Projekti 48:

Kompania Punekryese: Qemal Krasniqi B.I.

Nr. Prokurimit: 622-23-9902-5-2-1

Titulli i projektit: “Ndertimi i kanalizimit në Velezhë”.

Çmimi kontraktues: 24,703.66 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Qëllimi i këtij projekti është rregullimi i kanalizimit në fshatin Velezhë.
2. Punët që janë kryer gjatë këtij viti: Shenimi i kantierit, punët përgaditore, pastrimi i terrenit nga mbeturinat, demolimi i rrjetit ekzistues të vjetër. Germimi i kanalit me makine. Furnizimi, transporti, shtrirja dhe nivelizimi i zhavorit në trase dhe mbulimi i kanalit me zhavor pas vendosjes së gypave si dhe ngjeshja e tij. Largimi i ujërave nentokesor. Largimi i dheut të tepert të germuar. Furnizimi dhe montimi i gypave, pusetave, kapakeve etj. Testimi i rrjetit të kanalizimit kur ky rrjet funksionalizon shumë mirë.
3. Buxheti i shpenzuar kundrejt buxhetit të planifikuar: Totali i pagesave të kryera që nga fillimi i ekzekutimit të punimeve janë gjithsej 1 pagesë me vlerë: 18,348.05€, ndërsa vlera e mbetur për pagesë është 6,355.61€.
4. Çështjet Problematike: Nuk mund të bëhet vazhdimi i punimeve për shkak të problemeve me pronën.
5. Rezultatet e përgjithshme (numra, statistika të përgjithshme nga e gjithë puna):
Që nga fillimi i kontratës janë ndërtuar kanalizime me gjatësi L= 431.85m'. Kanë përfunduar gjithsej 74.27% të punimeve.

Projekti 49:

Kompania Punekryese: EuroVia Shpk

Nr. Prokurimit: 622-23-8369-1-1-1

Titulli i projektit: "Furnizim me zhavorr për rrugët e paasfaltuara në komunën e Prizrenit".

Çmimi kontraktues: 1,399,255.00 €

1. **Përshkrimi I Punimeve** : Janë kryer punime të ndryshme për furnizimi me zhavor dhe hapjen rrugeve, hapjen e kanaleve për ujë, pastrim mbeturinash inerte dhe të ndryshme neper rrugët e qytetit , fshatra , shtruarja e rrugeve me zhavor etj.

Punimet e realizuara nga muaji Janar deri në Nentor 2024

Të faturuara 2023 në vlerë 21,815.60 €

Të faturuara 2024 në vlerë 215,745.06 €

Të faturuara 2024 në vlerë 119,677.65 €

Janar –Shkurt

Rruga fshatit Smaç-Maushë, Rruga " Gurishta" lagj. Dardania , Rruga Novoselan

Gernqare, Rruga " Fahredin Hoti " , Rruga perball Terminalit Petrove, Rruga " Emin Abazi " Prizren ,

Gjatesia totale e rrugeve L=3,635 m. Të faturuara 78,271.75 €

Mars

Rruga në Arbanë djathtas për Nashecë, Rruga " Besim Shala " lagj. B. Curri, Rruga " Bajram Shala " lagj. B. Curri , Te rrethi Hoqes djathtas ka shtallë e AFIONIT Gorica-Prizren, Rruga për CVILEN- shtëpi Malore, Rruga "Masar Ferati " Prizren ,

Gjatesia totale e rrugeve L=8,350 m. Të faturuara 78,541.00 €

Prill

Rruga nga TA -Magjistarale - Petove, Rruga fushore Punime në ROMAJË, Rruga në Vlashne e asfaltuar nga R. Tahirin, Rruga " Mbreti Pleurat " vazhdimi , Rruga në Zhur ka varrezatë eperme të Omajt, Rruga në Zojze herë e Dyte, Rruga " Liman Shala " V. Curri vazhdimi I rrugës, Rruga për Lybeqeve –Pastrim mbeturinave, Rr. për Levunë-Lybeqeve – Rruga 1+1

Gjatesia totale e rrugeve L=7,150 m. Të faturuara 218,193.44 €

Maj

Rruga per Vlashne – Gorice, Rruga ne Hoqe te Qytetit 1, Rruga " Musli Gashi " ne lagjen Bajram Curi, Rruga "Ylber Fanaj " ne lagjen Bajram Curi, Rruga "Alajdin Xhezairi " ne, lagjen Bajram Curi, Rruga " Brigada 125 " ne lagjen Bajram Curi, Rruga ne Hoqe te Qytetit 2 Kanali Atmosferik ne fshatin Nashec

Gjatesia totale e rrugeve L=1,975 m, Të faturuara 58,712.50 €

Maj-Korrik-Gusht-Shtator

Rruga ne Sredska, Rruga e pastruar ne MANASTIRIC, Kanali atmosferik ne CAPARACË, Rruga te ujvara ne Korishe, Rruga Gorice/Kobaj Bajram Curri, Rruga fushe ne Petrove ka LOYOLA deri te beton " PIKA "

Gjatesia totale e rrugeve L=4,050 m, Të faturuara 75,849.75 €

Korrik-Gusht-Shtator-Tetor

Mbreti Pleurat ne lagjen " B. Curri " Rr.4.1, " Ylber Fanaj " Rr.4.2 dhe Rr.4.3 ne " B. Curri, Rr.4.4 dhe Rr.4.5 Brigada 125 ne " B.Curri ", Te qerdhja e Femijve te shkolla ne B Curr Rr.4.6, Rruga Rezistenca e Verinit Bajram Curr Rr.4., Rruga Mehmet Hasi – Bajram Curr nga URA, Pastrimi I kanalit ne Krushe te Vogel

Rruga Mehmet Hasi S=2685 m²,

Gjatesia totale e rrugeve L=1,380 m, Punuar dhe Pa faturuara 103,5224.00 €

Raporti :

Totali Faturuar: 866,806.75 €

Janë paguar : 634,527.61€

Pa paguar : 232,279.14 €

• Të Pa faturuar : 103,524.00 €

Nentor

• Të pa faturuara dhe të pa llogaritura punimet janë edhe një shume e

konsiderueshme.

• Mbushja e gropës ne Bazhdarhane S=850 m² h= ? dhe Rruga Cvilenit me L=2750 m

• Të kryera të pa faturuara afërsisht edhe nje sasi e konsiderueshme (xxxx €) pas

matjeve.

Projekti 50:

Kompania Punekryese: Qemajl Morina B.I.

Nr. Prokurimit: 622-23-3424-5-2-1

Titulli i projektit: “Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Poslisht”.

Çmimi kontraktues: 197,613.77 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Përmirësimi i infrastrukturës përmes ndërtimit të rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Poslisht.

2. Punët që janë përfunduar:

Punimet të kryera gjatë periudhës Janar-Nëntor 2024- të paguara janë:

Aksi 5 = 8,739.97 €

Aksi 15 = 1,826.01 €

Aksi 17 = 4,918.09 €

Aksi 18 = 5,685.58 €

Aksi 19 = 3,998.88 €

Aksi 20 = 10,373.91 €

Aksi 22 = 3,571.44 + 1,817.55 € = 5,388.99 €

Punimet të kryera gjatë periudhës Janar-Nëntor 2024 dhe të pa paguara (borgj) janë ~ 30,000.00 €

Aksi 5- muri mbrotjës,

Aksi 10- kubëzimi i rrugës

Aksi 17- kubëzimi (pjesa e mbetur e aksit)

Aksi 13- kubëzimi (vazhdimi i rrugës)

Aksi 24- kubëzimi (aksi i ri)

Foto nga terreni:



Projekti 51:

Kompania Punekryese: Pro&Co Group SH.P.K ; ARCHI TIME SH.P.K

Nr. Prokurimit: 622-23-11968-5-2-1

Titulli i projektit: "Asfaltimi I rrugës në Kobajin e Vjetër".

Çmimi kontraktues: 277,777.77 €

1. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Punimet përfshijnë asfaltimin e rrugës me një gjatësi prej 1,796.28 metrash dhe gjerësi 6.5 metra (5 metra asfaltuar), si dhe shenjëzimet, vendosjen e kanalizimeve, shenjave rrugore dhe mbrojtjes.
2. Punët që janë përfunduar: Hapja dhe gërmimi i trasesë së rrugës dhe kanaleve anësore, sipas thellësive të përcaktuara në projekt, ngjeshja dhe nivelimi i terrenit të gërmuar, mbushja dhe përgatitja e bazamentit të rrugës me dhe të zgjedhur, Furnizimi dhe shtrimi i shtresave stabilizuese me material guror, fraksion 0-150 mm dhe 0-63 mm.
3. Gjendja aktuale: Deri ne keto momente punë të realizuara rreth: **46,000.00 €** ose 17% e kontratës e realizuar

Te paguara deri: **0.00 €**

Punë të realizuara dhe të pa paguara deri tani rreth: **46,000.00 €**
4. Çështjet Problematike: Për shkak te gabimeve dhe mangesive ne projekt si dhe mos efikasitetit te OE ka vonesa ne realizimin e punimeve.



Projekti 52:

Kompania Punekryese: Pro&Co Group SH.P.K ; ARCHI TIME SH.P.K

Nr. Prokurimit: 622-23-12566-5-1-1

Titulli i projektit: “Ndërtimi I infrastrukturës në Hoçë e Qytetit, rrugë dhe kanalizim”.

Çmimi kontraktues: 555,500.00 €

3. Përshkrimi i shkurtër i projektit dhe qëllimet: Përmirësimi i infrastrukturës përmes ndërtimit të rrugëve, ndriçimit publik, ujësjellësit dhe kanalizimit në fshatin Hoçë e Qytetit.
4. Punët që janë përfunduar: Gërmimi i trasesë për rrugët në thellësi të përcaktuara (kategori III-VI), nivelimi i terrenit dhe përgatitja e bazës për shtresat mbështetëse, instalimi i tubave të kanalizimit fekal etj.
5. Gjendja aktuale: Deri ne keto momente punë të realizuara rreth: **50,000.00 €** ose 9% e kontratës e realizuar

Te paguara deri: **0.00 €**

Punë të realizuara dhe të pa paguara deri tani rreth: **50,000.00 €**

6. Çështjet Problematike: Për shkak te gabimeve dhe mangesive ne projekt si dhe mos efikasitetit te OE ka vonesa ne realizimin e punimeve.



Projekti 53:

Autoriteti Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures
Kontraktues:
Punekryesi: OE Fortesa Shpk , Prizren
Projekti: “Ndërtimi i infrastrukturë në Korishë – Projekt dy vjeçar”

Nr. Kontratës **Nr. Prokurimit: 622-23-13004-5-1-1**

Vlera e kontratës **1,424,995.34 €**

Pagesat e kryera

- Situacioni I : 16,963.50 €
- Situacioni II : 23,036.50 €
- Situacioni III : 100,000.00€ €
- Situacioni IV : 30,000.00 €
- Situacioni V : 30,000.00 €
- Situacioni VI : 50,000.00 €
- Situacioni VII : 4,340.00 €
- Situacioni VIII : 202,521.
- **Totali : 456,861.8 € (të paguara deri më tani)**

Fillimi i Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 13.02.2024

punimeve

Plani Dinamik Realizimi punimeve sipase planit dinamik (300 dite) dy vjeçar

Realizimi i Punimeve

Punimet të kryera gjate periudhës |Shkurt-Dhjetor 2024 dhe të pa paguara(borgj) janë ~ 130,000.00 €

Punimi i rrugëve, mureve mbrojtëse, trotuarëve, kanalizimeve atmosferike dhe kanalizimeve fekal. Gjithsejt 35 Akse. Aksi 2 - Kanlizimi Fekal si dhe pergaditja e bazës për kubza;

Aksi 3; Pergaditja e bazes per kubza

Aksi 4 – Ka perfunduar;

Aksi 5 - Pergaditja e bazes per kubza dhe perfundimi i 70% te kubzimit te rruges;

Aksi 7,8 dhe 9 kane perfunduar ne tersi;

Aksi 10 -Ka perfunduar kanalizimi fekal, nje pjese e kanalizimit atmosferi dhe nje pjese e bazes per kubza;

Aksi 11 dhe Aksi 12 kane perfunduar ne tersi;

Aksi 13 Ka perfunduar kanalizimi fekal si dhe baza.

Aksi 14 dhe Aksi 15 - Kane perfunduar te gjitha punimet;

Aksi 16 Ka perfunduar baza dhe jemi ne procedure te vendosjes se gureve skajore;

Aksi 20 dhe 21 kane perfunduar ne teresi;

Aksi 22 – Ka perfunduar kanalizimi fekal dhe pergaditja e bazes per kubza;

Aksi 24 – Kane perfunduar te gjitha punimet;

Aksi 28 dhe Aksi 30 Kane perfunduar punet e bazes per kuba;


Aksi 34 - Kane perfunduar te gjitha punimet; Aksi 35 - Kanalizimi Fekal.

Disa foto nga tereni



Projekti 54:

Autoriteti	Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures
Kontraktues:	O.E. “ G-PROJECT ” SH.P.K- Prizren
Punekryesi:	” Rehabilitimi dhe revitalizimi i hapsirave publike në zonën e parë të mbrojtur në pjesën e vjetër të qytetit, Ndërtimi i rrugës Shuaip Spahiu, projekt dyvjeçar ”
Projekti:	Nr. Prokurimit: 622-23-9421-5-1-1
Nr. Kontratës	578,775.36 €
Vlera e kontratës	
Pagesat e kryera	• Situacioni I : 69,746.6 € • Situacioni II : 29,437.3 € • Situacioni III : 67,278.90 € • Situacioni IV : 187,052.42 € • Situacioni V : 73,275.40 • Situacioni VI : 68,539.60 € • Totali : 495,330.22 € (të paguara deri më tani)
Fillimi i punimeve	Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 30.11.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik (400 dite) dy vjeçar
Realizimi i Punimeve	Punimet të kryera gjate periudhës Gusht-Dhjetor 2024 dhe të pa paguara(borgj) janë ~ 83,445.14 € Eshte bere montimi i kalldermit Eshte bere montimi i shtyllave te ndriqimit e tj.

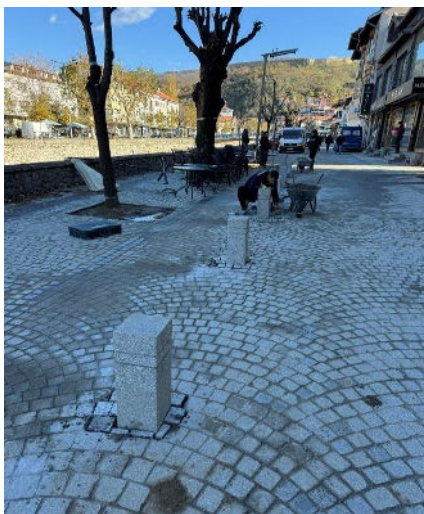

Projekti 55:

Autoriteti Kontr.:	Komuna e Prizrenit
Punekryesi Projekti	O.E. " G-PROJECT " SH.P.K- Prizren " Rehabilitimi dhe rivitalizimi i hapësirave publike në zonën e parë të mbrojtur në pjesën e vjetër të qytetit, restaurimi i shesheve dhe objekteve, projekt trevjeqar "
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-23-11319-5-1-1
Vlera e kontratës	3,000,000.00 €

Fillimi i punimeve	Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 29.12.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik 36 muaj kalendarik.
Realizimi i Punimeve	Punimet janë duke u zhvilluar me intensitet të lartë në shtrierjen e kalldrëmave, skajorëve dhe pllakave nga graniti si dhe kalldrëmave lumorë nga ekipe te kualifikuara për kryerjen e punimeve të natyrës së këtillë. Punimet janë duke u zhvilluar ne përputhje të plotë me planin dinamik. Është përfunduar pjesa kryesore e sheshit të Shadërvanit deri tek Ura e Kaltërt dhe rruga Bekim Fehmiu ndërsa punimet janë duke u zhvilluar nga Ura e Kaltërt në drejtim të parkingjeve pasi që fillimisht në koordinim me Hidroregjionin Jugor është dashur të bëhet shtrierja e sistemit të ri të ujësjellësit e pastaj të fillohet me shtrimin e kalldrëmit dhe punimet po vazhdojnë edhe në segmentin tek rruga Berati me kalldrëm lumorë. Situacioni 1: 49,999.00 € Situacioni 2: 74,719.81 € Situacioni 3: 198,181.47 € Situacioni 4: 127,243.93 € Situacioni 5: 78,628.28 € Situacioni 6: 152,982.62 € Situacioni 8: 231,075.62 €

Pagesat totale: 1,150,000.00 €

Pune te kryera te cilat nuk jan paguar : 800,000.00 €



Projekti 56:

Autoriteti Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures
Kontraktues:
Punekryesi: O.E. “RENELUAL TAHIRI SH.P.K. & QUALITY ASPHALT” SH.P. K
Projekti: “ Ndertimi i infrastruktures ne fshatin Gjonaj “
Nr. Kontratës Nr. Prokurimit: 622- 24 - 4513 - 5-1-1
Vlera e kontratës 1,659,389.50 €



Pagesat e kryera

- Situacioni I : 111.614.24 €
- Situacioni II : 50.000.00 €
- Situacioni III : 88.393.66 €
- **Totali : 250, 007.90 €** (të paguara deri më tani)

Fillimi i Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 28.08.2024
punimeve
Plani Dinamik Realizimi punimeve sipase planit dinamik (700 dite)
Realizimi i Punimet të kryera gjate periudhës Gusht-Dhjetor 2024 dhe të pa
Punimeve paguara(borgj) janë ~ 70,000.00 €

- Aksi 1 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 2 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 3 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 4 – Ruge me kubeza e perfunduar;
- Aksi 5 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 6 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 7 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 8 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 9 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 10 – Ruge me kubeza e perfunduar
- Aksi 6 – E asfaltuar shtresa e pare
- Aksi 7 – E asfaltuar shtresa e pare
- Aksi 8 – E asfaltuar shtresa e pare
- Aksi 9 – E asfaltuar shtresa e pare
- Aksi 10 – E asfaltuar shtresa e pare
- Aksi 11 – E asfaltuar shtresa e pare
- Eshte filluar punimi i trotuarit

DISA FOTO NGA TERENI

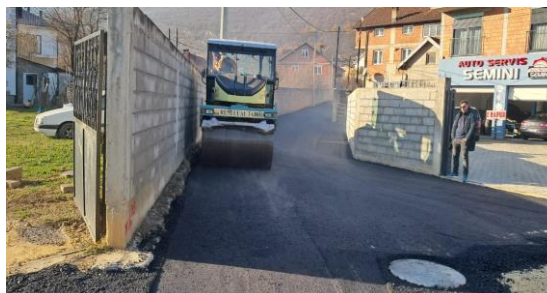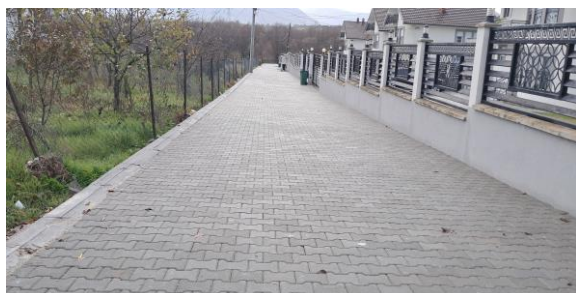

Projekti 57:

Autoriteti	Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures
Kontraktues:	
Punekryesi:	“ EBK” SH.P.K. : SHABANAJ A & A SH.P.K.
Projekti:	“Rrëgullimi i mureve mbrojtëse ne Komunën e Prizrenit,Landovicë,Randobravë Fshatrat e Zhupës ,Has , Vërri e tjera”
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-24-987-5-1-1
Vlera e kontratës	1,500,000.00 €
Pagesat e kryera	• Situacioni I : 130.000.00 € • Situacioni II : 150.000.00 € • Situacioni III : 100.000.00 €
	Totali : 380, 000.00 € (të paguara deri më tani)
Fillimi i punimeve	Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 20.05.2024
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik 3 vite (36 muaj)
Realizimi i Punimeve	Punimet të kryera gjate periudhës Maj-Dhjetor 2024 dhe të paguara(borgj) janë ~ 200,000.00 € - Muri ne Leskoves te Lapidari UÇK-se - Muri ne Pouske - Muri ne Poslisht - Muri ne Billushe - Muri ne Skorrobisht - Muri ne Krushe te Vogel - Muri ne Reqane - Muri ne Nepregoshte - Muri ne Gernqare - Muri ne Poslishte - Muri ne B.Curr - Muri ne Tusuz - Muri ne Jeshkove



Projekti 58:

Autoriteti Kontraktues: Komuna e Prizrenit – sektori i infrastruktures

Punekryesi: O.E. “EDIBAU-ING” SH.P.K- Prizren

Projekti: Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë

Nr. Kontratës **Nr. Prokurimit:** 622-24-8282-5-2-1

Vlera e kontratës 336.666,66 €

Pagesat e kryera • Situacioni I – 45,399.63 €
 • Situacioni II - 70,000.00 €


Totali: 115,399.63 € (të paguara deri më tani)

Fillimi i punimeve Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 27.09.2024

Plani Dinamik Realizimi punimeve sipase planit dinamik 300 dite

Realizimi i Punimeve Janë përfunduar rrugët me kubza dhe është duke u punuar në ndërtimin e kanalit të përrockës me beton.

Të bashkangjitur gjeni foto nga punimet ne terren.

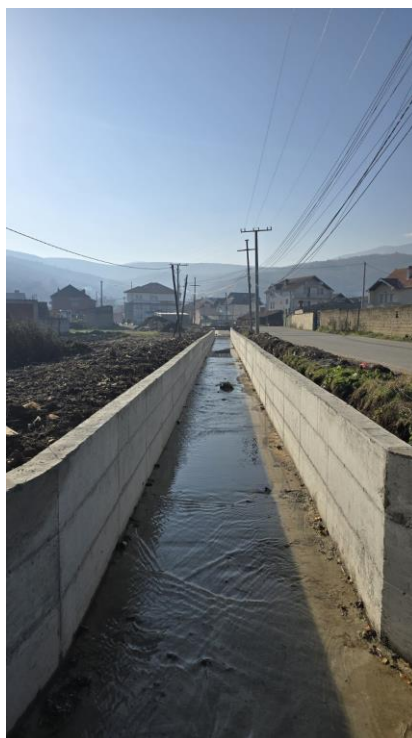

Projekti 59:

Autoriteti Kontr.: Komuna e Prizrenit

Punekryesi O.E. " TSR " SH.P.K- Prishtinë

Projekti Shenjëzimi horizontal, vertikal dhe sinjalizues në qytet dhe fshatrat e Komunës së Prizrenit

Nr. Kontratës Nr. Prokurimit: 622-23-13919-5-1-1

Vlera e kontratës 1,000,000.00 €

Fillimi i punimeve Punimet kan filluar sipas kontratës me datën 14.10.2024

Plani Dinamik Realizimi punimeve sipase planit dinamik 36 muaj kalendarik.

Realizimi i Punimeve Realizimi i punimeve në sinjalizimin horizontal dhe vertikal në komunikacionin rrugor për KK Prizren:

1. Sinjalizimi Horizontal:

- Pastrimi dhe përgatitja e sipërfaqes së rrugës.
- Aplikimi i materialeve sinjalizuese, si bojë termoplastike ose bojë akrilike, sipas standardeve.
- Përdorimi i pajisjeve speciale për shënjimin preciz të vijave rrugore (vija gjatësore, tërthore, simbole dhe shenja specifike).

2. Sinjalizimi Vertikal:

- Vendosja e shtyllave mbajtëse dhe bazamenteve të nevojshme.
- Montimi i tabelave me sinjalizim të miratuar sipas projektit.
- Kontrollimi dhe sigurimi i stabilitetit dhe dukshmërisë së tabelave.

Procesi përfundon me inspektimin përfundimtar për të siguruar që punimet janë kryer sipas specifikimeve teknike dhe standardeve.

Punimet janë duke u realizuar ne nivel te knaqeshem



Projekti 60:

Autoriteti Kontraktues:	Komuna e Prizrenit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Sektori i Infrastrukturës Rr. "Remzi Ademaj" p.n., Prizren, 20000
Punekryesi:	O.E. "Qemajl Morina" B.L., Rr. "11 Marsi" Lam/1 pn, Prizren, 20000
Projekti:	"Ndërtimi i infrastrukturës në Kushnin Has, rrugët dhe kanalizimi- projekt dy vjeçar "
Nr. Kontratës	Nr. Prokurimit: 622-23-687-5-1-1
Vlera e kontratës	148,929.82 €
Pagesat e kryera	1. Situacioni I- Fat. 24-SHV01-001-6= 9,999.95 € 2. Situacioni II- Fat. 24-SHV01-001-8= 8,202.92 € 3. Situacioni III- Fat. 24-SHV01-001-9= 19,999.92 € 4. Situacioni IV- Fat. 24-SHV01-001-10= 11,790.00 € Totali: 49,992.79 € (të paguara deri më tani)
Fillimi i punimeve	Punimet kane filluar sipas kontratës me datën 23.12.2023
Plani Dinamik	Realizimi punimeve sipase planit dinamik (kontratë dy vjeçare 24 muaj)

Foto nga terreni



I. Hyrje

Sektori i Menaxhimit të Mbeturinave dhe Mjedisit mban përgjegjësi në sigurimin e një mjedisi të pastër dhe të qëndrueshëm. Qëllimi kryesor është menaxhimi efektiv i mbeturinave dhe mirëmbajtja e hapësirave publike, duke kontribuar në përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.

Për të realizuar këto qëllime, sektori përcakton kontratat në disa kategori, të cilat mbulojnë shërbimet e rregullta, projektet e veçanta dhe aktivitetet mjedisore.

II. Kategoritë e Kontratave

Në funksion të objektivave të sektorit, kontratat klasifikohen në:

1. Kontrata për shërbime të rregullta

Këto janë kontrata mbulojnë mirëmbajtjen e qytetit, duke përfshirë:

- Pastrimin e rrugëve dhe hapësirave publike.
- Menaxhimin e mbeturinave, përfshirë grumbullimin dhe transportimin e tyre.
- Shërbime rutinë që sigurojnë një mirëmbajtje të vazhdueshme të ambientit.

2. Kontrata për projekte të veçanta

Këto janë angazhime të përkohshme që synojnë përmirësimin dhe trajtimin e veçantë të hapësirave publike që përfshijnë:

- Rehabilitime të hapësirave të gjelbra në zona urbane dhe rurale.
- Projekte të veçanta për trajtimin e mbeturinave.

3. Aktivitete dhe fushata mjedisore

Kjo kategori përfshin aktivitete që rrisin ndërgjegjësimin dhe që promovojnë mbrojtjen e mjedisit, sikurse:

- Fushatat për pastrimin të hapësirave publike.
- Mbjellje e pemëve dhe krijimi i hapësirave të reja të gjelbra.
- Edukimi dhe promovimi i menaxhimit të duhur të mbeturinave me qytetarë.

1. KONTRATAT PËR SHËRBIME TË RREGULLTA

Nr.	Përshkrimi i kontratës	Referenca	Lloji i kontratës	Afati i kontratës	Vlera (€)
1	Menaxhimi i mbeturinave, grumbullimi, transporti dhe deponimi në komunën e Prizrenit		Kontratë në shtëpi	01.02.2023 01.02.2025	3,259,401.60
2	Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve (zona I dhe II) në komunën e Prizrenit	01-153/22 (27.08.2023)	Kontratë në shtëpi	27.09.2022 30.09.2025	4,323,354.16
3	Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve (zona III) në komunën e Prizrenit	01-97/22 (07.07.2022)	Kontratë në shtëpi	07.07.2022 06.07.2025	1,951,494.20

RAPORTI FINANCIAR

Menaxhimi i mbeturinave, grumbullimi, transporti dhe deponimi në komunën e Prizrenit			
Përshkrimi	Vlera e faturës	Shuma e paguar	Përqindja
Vlera e kontraktuar	1,222,275.60	1,222,275.20	
Pagesat 2022			
Pagesat 2023		1,493,892.40	
Pagesat 2024		1,222,275.20	
Totali i paguar		2,716,167.60	83.33% e totalit
Mbetja për pagesë			543,234.00 (16.67%)

Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve (zona III) në komunën e Prizrenit			
Përshkrimi	Vlera e faturës	Shuma e paguar	Përqindja
Vlera e kontraktuar	417,885.80	409,915.55	
Pagesat 2022			
Pagesat 2023		574,342.40	
Pagesat 2024			
Totali i paguar		984,257.95	50.44%
Mbetja për pagesë		967,236.25	49.56%

Riparimi dhe mirëmbajtja e rrugëve (zona I dhe II) në komunën e Prizrenit			
Përshkrimi	Vlera e faturës	Shuma e paguar	Përqindja
Vlera e kontraktuar	913,493.26	913,493.26	
Pagesat 2022			
Pagesat 2023		1,408,447.88	
Pagesat 2024			
Totali i paguar		2,321,941.14	53.71%
Mbetja për pagesë		2,001,413.02	46.29%

Përmbledhje e aktiviteteve të veçanta për realizimet në kontratat për zonat I, II, III, vetëm për sezonin pranveror, ndërsa për sezonin vjeshtor raportojmë në muajin dhjetor.

GALERIA E FOTOVE



Nr	Lokacioni i punëve të kryera	Trenda fila	Laura	Fo tin i	Evonimu s	Drunje / Kumbull a	Shkurr e	Lule / sezona le	Mbjellj a barit m2	Germim i i dheut m2
1	Rruga Remzi Ademaj	179	213	213	213	5	63		400	400
2	Rruga Adem Jashari	82	193+60	193+60	193+62	+35	23+55		350+170	35+1700
3	Landovicë		20	20						
4	Parku ne Lakuriq					30				
5	Shtëpia e Bardhe						3	33		
6	Poslisht					30				
7	Stacioni i Autobuseve						43	72		
	Totali	261	546	486	468	65	152	105	920	920

Sasia e mbeturinave per periudhen 2023/2024:

Nr.	Mbeturinat 2023		Mbeturinat 2024		Krahasimi 2023/2024	%
1	Janar	3,712,459	Janar	3,748.22	35,761	0.96%
2	Shkurt	3,067,020	Shkurt	3,264.98	197,960	6.45%
3	Mars	3,743,750	Mars	3,462.03	-281,712	-7.52%
4	Prill	3,666,580	Prill	3,901.74	235,160	6.41%
5	Maj	4,273,090	Maj	4,057.34	-215,750	-5.05%
6	Qershor	4,142,460	Qershor	3,886.36	-256,100	-6.18%
7	Korrik	4,954,620	Korrik	5,148.32	193,700	3.91%
8	Gusht	5,732,280	Gusht	5,915.10	182,720	3.19%
9	Shtator	4,257,930	Shtator	4,519.01	261,080	6.13%
10	Tetor	4,020,800	Tetor	4,499.18	478,380	11.90%
11	Nentor	3,827,310	Nentor	3,983.28	155,970	4.08%
12	Dhjetor	3,767,180	Dhjetor	4,093.38	-3,767,180	-100.00%
	Totali 12 muaj	49,165,479	Totali 12 muaj	50,478.94	-2,780,011	-5.65%
	Mesatarja 12 muaj	4,097,123	Mesatarja 12 muaj	4206.57		

forma grafike


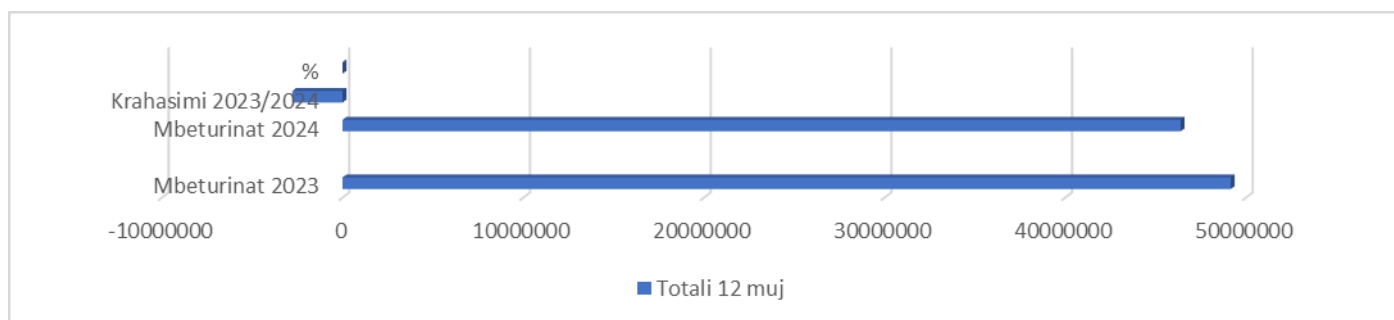


Tabela e inkasimit dhe faturimit për periudhën Janar – Dhjetor 2024:

	ANA DRINI	HASI	LUMA	MALESIA E RE	PRIZREN	VRRINI T	ZHUPA	ANA DRINI
Sipas Faturave	106,663.50	148,192.10	127,726.00	140,176.00	1,314,876.10	71,843.00	156,326.50	106,663.50
Inkasimi	55,575.00	66,101.70	63,979.45	79,856.40	659,444.50	31,439.50	75,358.85	55,575.00
Mbetja	51,088.50	82,090.40	63,746.55	60,319.60	655,431.60	40,403.50	80,967.65	51,088.50
Përqindja	52.1	44.61	50.09	56.97	50.15	43.76	48.21	52.1

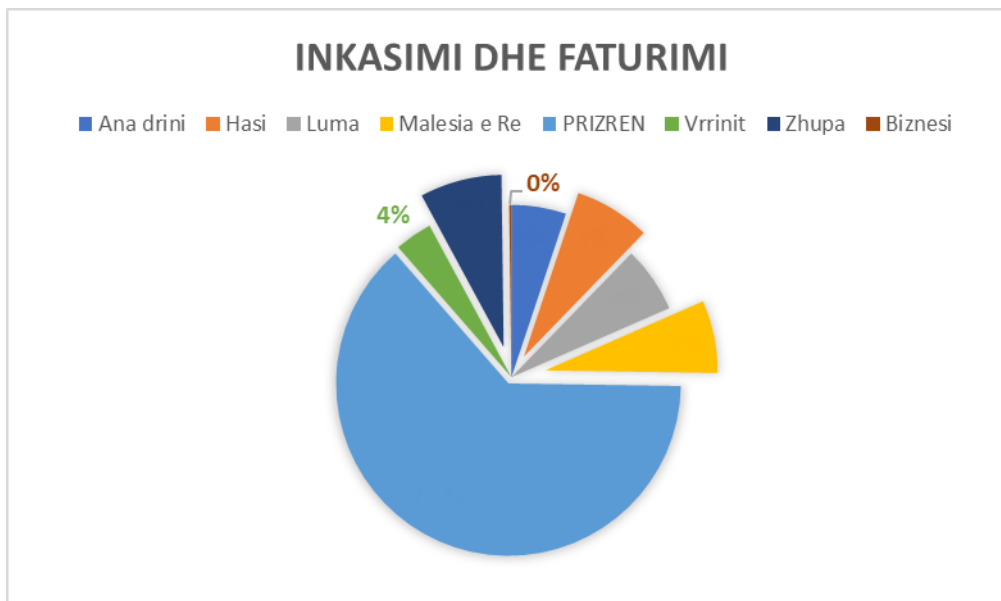

Pastrimi i pikave ilegale të mbeturinave

Grumbullimi, transporti dhe deponimi i mbeturinave inerte nga pikat e egra në qytet dhe periferi :

Nr.	Lokacioni i punëve të kryera	Nj. mat	Sasia	Zona
1	NOVOSELAN	ton	30	III
2	NASHEC	ton	60	I-II
	Totali		90	

GALERIA E FOTOVE



Pastrimi i bores

HAPJA DHE LARGIMI I BORES, NGA RRUGET, SI DHE KRYPOSJA E RRUGEVE							
SPECIFIKACIONI SIPAS INTERVENIMIT MUAJI / NENTOR 2024							
Nr	Data	Lokacioni	Ora e fillimit	Ora e përfundimit	Nr .Orë Punë/h	Sasia e krypës në kg.	Aseti
1	29.11. 2024	Prizren-Gjonaj-Mazrek-Kojush-Planej-Milaj-Gorozhup-Zym-Karashëngjergj	10:00	13:00	3:00	4 TON	Mercedes 04-296-FN
2	29.11.	Pousk-Jabllanic (cvilen)	12:00	14:00	2:00	3 TON	Unimog 04-

	2024						946-JO
3	29.11.2024	Manastiric, Nepregoshte, Lubinje E&P, Drajqiq, Pllanjan, Llokvic, Struzhe	10:00	14:10	4:10	4 TON	Unimog 04-367-GQ
4	29.11.2024	Novoselan, Skorobisht	12:00	14:30	2:30	3 TON	Unimog 04-336-EB
5	29.11.2024	Lubiqev, Leskovec	14:30				
6	29.11.2024	Genqare	14:40				

Raporti i mbeturinave te vëllimshme aksion pranveror maj dhe aksion vjeshtor nëntor 2024

Nr	lokacionet	Ngarkesa	Materialet
	I tere territory I komunes	159 kamione	Te gjitha mbeturinat duke I perfshire orendi shtepiake, pajisje elektrike shtepiake dhe shume lloje tjera.
	TOTALI	159	1 ngarkese/ 5-6t
	TOTALI		954 / t

2. Kontrata për projekte të veçanta

nr	Titulli I projektit	Vlera e projektit	Vlera e paguar	Borgji I mbetur	Fillimi I punimeve	Perfundimi I planifikuar I punimeve	Punimet e realizuara %
1	Rregullimi i trotuareve,Piranë – Zojz dhe Piranë - Reti	132,499.74 €	110,004.60€	22,495.14€	tetor 2023	Kontrate dyvjeqare	100.00 %
2	Ndërtimi i infrastrukturës rrugë dhe kanalizim në fshatin Piranë,projekt dy vjeqar	178,827.26 €	140,457.64€	38,369.62€	shtator 2023	Kontrate dyvjeqare	100.00 %
3	Dekorimi i qytetit për festat e fund vitit	88,480.00€	0	88,480.00€	10 Shtator	20 Janar 2025	50.00%
4	Ndërtimi i shtëpizave për festat e funditvitit	69,805.50€	0	69,805.50€	1 Tetor	30 Nentor	95.00%
5	Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeqar	113,484.00 €	100.000.00€	13,484.00€	15 Maj 2024	Kontrate dyvjeqare	80.00%
6	Rregullimi I parkut ne lagjen Dardania - Projekt dyvjeqar	0	0	79365.50€	Gusht 2024	Kontrate dyvjeqare	45.00%
7	Ndertimi I kater parqeve	297,046.64 €	102,852.54 €	194,194.10 €	Janar 2023	Kontrate dyvjeqare	98.00%
8	“Projekte ambientale – trajtimi dhe rrethimi i hapësirave publike ”	300,000.00 €	234,711.94€	65,288.06€	Maj 2022	Maj 2025	78.00%

Me poshte prezantohen kontratat me pershkrime dhe foto

3	Dekorimi i qytetit për festat e fund vitit	622-24-6616-2-2-1	Kontratë publike	88,480.00 €	10 Shtator	20 Janar 2025	50.00%
Punimet jane ne vazhdim							



4	Ndërtimi i shtëpizave për festat e funditvitit	69,805.50€		69,805.50 €	1 Tetor	30 Nentor	95.00%
Punimet jane perfunduar							



5	Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar	113,484.00€	100.000.00 €	13,484.00 €	15 Ma j 2024	Kontrate dyvjeqare	80.00%
---	---	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------------	--------



6	Rregullimi I parkut ne lagjen Dardania - Projekt dyvjeqar	79365.50€	Gusht 2024	Kontrate dyvjeqare	45.00%
Punimet jane ne realizim					




7	Ndertimi I kater parqeve	297,046.64 €	102,852.54 €	194,194.10 €	Janar 2023	Kontrate dyvjeqare	98.00%
---	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------------	--------

Vlera e kontrates:	297,046.64 €	Vlera e situacioneve	Te papaguar
I	Pagesa e situacionit te pare	28,700.56 €	0.00 €
II	Pagesa e situacionit te dyte 74,151.98 €-7400.50 €=66,751.48 €	74,151.98 €	7,400.50 €
III	Vlera e situacionit te trete I pa paguar	78,591.82 €	78,591.82 €
	TOTALI	181,444.36 €	85,992.32 €
	VLERA E PUNIMEVE TE KRYERA:	181,444.36 €	85,992.32 €
	Vlera e mbetur pa u ekzekutuar e kontrates:	115,602.28 €	



	“Projekte ambientale – trajtimi dhe rrethimi i hapësirave publike”	300,000.00€	234,711.94€	65,288.06€	Maj 2022	Maj 2025	78.00%
Pagesat e kryera		Situacioni VIII - 16,357.00 € Situacioni IX - 15,005.00 € Situacioni X - 20,000.00 € Situacioni XI - 30,000.00 € Totali: 81,362.00 € (të paguara gjatë vitit 2024)					
Realizimi i Punimeve		Janë duke u punuar rrethojat ne hapsirat e parqeve te qytetit te Prizrenit. Të bashkan jitur gëni foto n a unimet ne terren.					

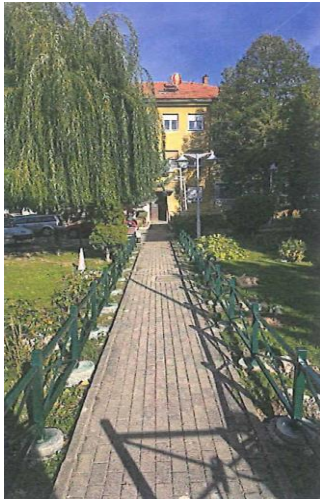

Leje Mjedisore 2024

Periudha	Lëndë të bartura	Lëndë të pranuar	Lëndë të shqyrtuara	Gjithsej
Janar Dhjetor	11	130	99	141

Sherbimet e administrative per Drejtorine e Sherbimeve Publike

Ejup Kryeziu .276 Kerkesa / Ankesa

276, Kerkesa per rregullimin e rrugeve me kubeza, dhe rregullimin e kanalizimit

Hatixhe Perzhella .76 Kerkesa /Ankesa

76 ,Kerkesa per shtrimin e rrugve me asfaltt. dhe disa me kubeza.

Muhamed Bajrami. Kerkesa / Ankesa 763

763, Kerkesa per Sektorin e Mbeturinave Rexhistrim te ri, anulim dhe ndryshim

Agnesa Kureshi Kerkesa / Ankesa 282

282, Kerkesa per Hyrje ne Sheshin Shadervan , Referenca ,Kerkesa per shfrytëzimin e hapësirave publike ,njoftime nga permabursi dhe kerkesa a po ankesa me akepercejllës ne drejtori te ndryshme te komunes cilan nuk jan ne kompetenca te drejtoris se DSHP es

Gezim Gergi 419 Kerkesa / Ankesa

419,Kerkesa jan per Ndricim Publik ,Drita shtylla ,dhe kerkusat nga OE dhe KEDS pelqime per gropim . Permes telefonit dhe paraqitjes fizike 482 kerkesa nga ana e qytetareve .

Galip Belallari 160 Kerkesa.

160, Kerkesa per Leje Mjedisore , Prerjen e lisave ,krasitje dhe tjera

Perparim Shala 434 Kerkesa / Ankesa

434, Kerkesa per leje taxi , shenjat e komunikacionit , pelqime per bllokimin e rruges dhe te tjra kerkesa lidhur me komunikacion,

Asim Kokaj 70 Kerkesa / Ankesa

70, Kerkesa per vazhdimin e linjave te autobusave, kerkesa per pelqim gropim te rruges ,kycje kanalizim ,kerkesa per shtrimin e rruges me zhavor .

Laura Suka 38 Kerkesa / Ankesa

38, Kerkesa per Ulese per hapsira te jashtme , per rregullimin e objekteve shkollore te jashtme ,per rethimin e verezave ,mbledhjen e druve dekorative , per dekorimin e qytetit dhe te tjera .

Te gjitha Kerkesa ,Ankesa, Njoftime janë me Nurmin e Protokolit me datën e kërkesës / ankesës dhe kategorizuara si pas llojit të tyre) .
